ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**MSU Cycle 1**	**49d**	**Fri 8/27/99**	**Wed 11/3/99**
2	**2 Mod'ls from ANL**	**1d**	**Fri 8/27/99**	**Fri 8/27/99**
3	**Optics Installation**	**45d**	**Mon 8/30/99**	**Fri 10/29/99**
4	**Instrument Mod'lA**	**20d**	**Mon 8/30/99**	**Fri 9/24/99**
5	Prepare Mod'lA	2d	Mon 8/30/99	Tue 8/31/99
6	Install tiles	2d	Wed 9/1/99	Thu 9/2/99
7	Install tubes	0.5d	Fri 9/3/99	Fri 9/3/99
8	Routing prep	0.5d	Fri 9/3/99	Fri 9/3/99
9	Insert Profiles	5d	Mon 9/6/99	Fri 9/10/99
10	Route Fibers	5d	Mon 9/13/99	Fri 9/17/99
11	Glue Fibers	4d	Mon 9/20/99	Thu 9/23/99
12	Polish Fibers	1d	Fri 9/24/99	Fri 9/24/99
13	**Test Mod'lA**	**5d**	**Mon 9/27/99**	**Fri 10/1/99**
14	**Instrument Mod'lB**	**20d**	**Mon 9/27/99**	**Fri 10/22/99**
15	Prepare Mod'lB	2d	Mon 9/27/99	Tue 9/28/99
16	Install tiles	2d	Wed 9/29/99	Thu 9/30/99
17	Install tubes	0.5d	Fri 10/1/99	Fri 10/1/99
18	Routing prep	0.5d	Fri 10/1/99	Fri 10/1/99
19	Insert Profiles	5d	Mon 10/4/99	Fri 10/8/99
20	Route Fibers	5d	Mon 10/11/99	Fri 10/15/99
21	Glue Fibers	4d	Mon 10/18/99	Thu 10/21/99
22	Polish Fibers	1d	Fri 10/22/99	Fri 10/22/99
23	**Test Mod'lB**	**5d**	**Mon 10/25/99**	**Fri 10/29/99**
24	**Pack Mod'lA**	**1d**	**Mon 11/1/99**	**Mon 11/1/99**
25	**Pack Mod'lB**	**1d**	**Tue 11/2/99**	**Tue 11/2/99**
26	**Ship 2 mod'ls to CERN**	**1d**	**Wed 11/3/99**	**Wed 11/3/99**
27	**MSU Cycle 2**	**56d**	**Fri 10/29/99**	**Fri 1/14/00**
28	**2 Mod'ls from ANL**	**1d**	**Fri 10/29/99**	**Fri 10/29/99**
29	**Optics Installation**	**55d**	**Mon 11/1/99**	**Fri 1/14/00**

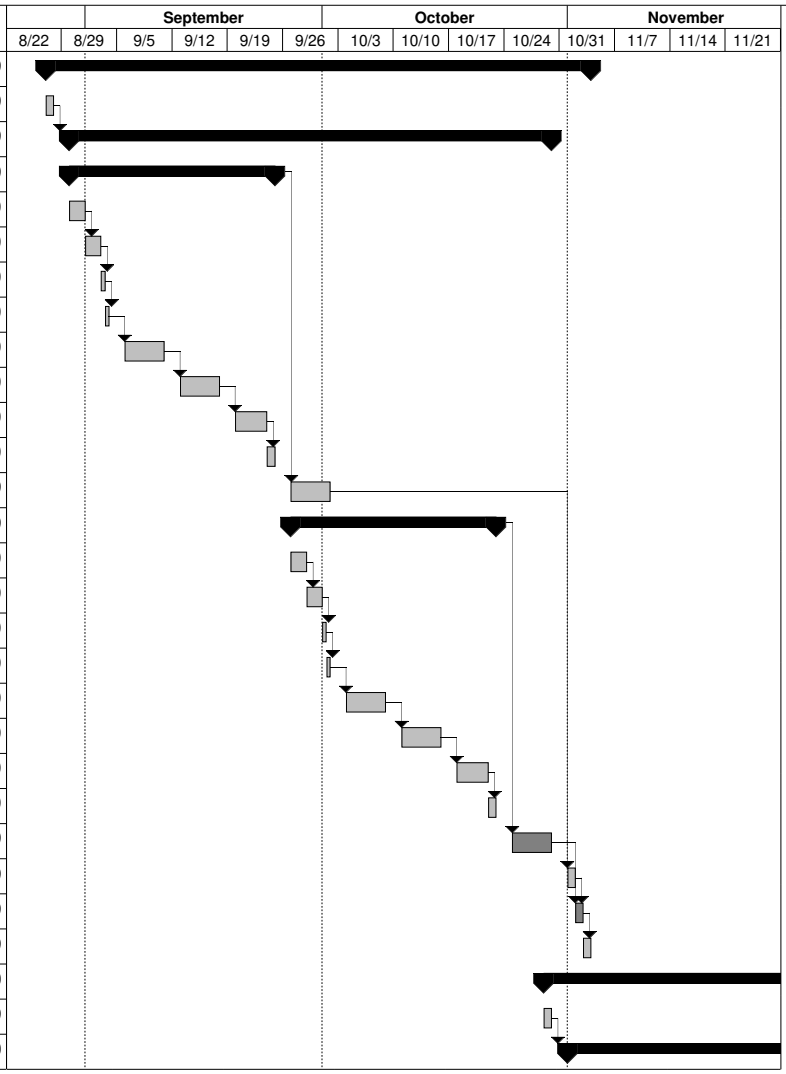

Project:
Date: Fri 10/2/98

Task
Progress
Milestone
Summary
Rolled Up Task
Rolled Up Milestone
Rolled Up Progress
