ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**MSU Cycle 1**	**49d**	**Fri 8/27/99**	**Wed 11/3/99**
2	**2 Mod'ls from ANL**	**1d**	**Fri 8/27/99**	**Fri 8/27/99**
3	**Optics Installation**	**38.25d**	**Wed 9/1/99**	**Mon 10/25/99**
4	**Instrument Mod'lA**	**18.38d**	**Wed 9/1/99**	**Mon 9/27/99**
5	Prepare Mod'lA	10h	Wed 9/1/99	Thu 9/2/99
6	Install tiles	11h	Thu 9/2/99	Fri 9/3/99
7	Routing prep	3h	Fri 9/3/99	Fri 9/3/99
8	Insert Profiles	29h	Mon 9/6/99	Thu 9/9/99
9	Route Fibers	51h	Thu 9/9/99	Fri 9/17/99
10	Glue Fibers	6h	Mon 9/20/99	Mon 9/20/99
11	Secure Fiber Bun	3h	Wed 9/22/99	Thu 9/23/99
12	Polish Fibers	1d	Thu 9/23/99	Fri 9/24/99
13	Closeup the Modu	7h	Fri 9/24/99	Fri 9/24/99
14	Cleanup	3h	Mon 9/27/99	Mon 9/27/99
15	**Test Mod'lA**	**15h**	**Mon 9/27/99**	**Wed 9/29/99**
16	**Instrument Mod'lB**	**18.38d**	**Mon 9/27/99**	**Thu 10/21/99**
17	Prepare Mod'lB	10h	Mon 9/27/99	Tue 9/28/99
18	Install tiles	11h	Tue 9/28/99	Wed 9/29/99
19	Routing prep	3h	Wed 9/29/99	Wed 9/29/99
20	Insert Profiles	29h	Thu 9/30/99	Tue 10/5/99
21	Route Fibers	51h	Tue 10/5/99	Wed 10/13/99
22	Glue Fibers	6h	Thu 10/14/99	Thu 10/14/99
23	Secure Fiber Bun	3h	Mon 10/18/99	Tue 10/19/99
24	Polish Fibers	1d	Tue 10/19/99	Wed 10/20/99
25	Closeup the Modu	7h	Wed 10/20/99	Wed 10/20/99
26	Cleanup	3h	Thu 10/21/99	Thu 10/21/99
27	**Test Mod'lB**	**15h**	**Thu 10/21/99**	**Mon 10/25/99**
28	**Pack Mod'lA**	**1d**	**Mon 11/1/99**	**Mon 11/1/99**
29	**Pack Mod'lB**	**1d**	**Tue 11/2/99**	**Tue 11/2/99**
30	**Ship 2 mod'ls to CERN**	**1d**	**Wed 11/3/99**	**Wed 11/3/99**
31	**MSU Cycle 2**	**56d**	**Fri 10/29/99**	**Fri 1/14/00**
32	**2 Mod'ls from ANL**	**1d**	**Fri 10/29/99**	**Fri 10/29/99**
33	**Optics Installation**	**55d**	**Mon 11/1/99**	**Fri 1/14/00**

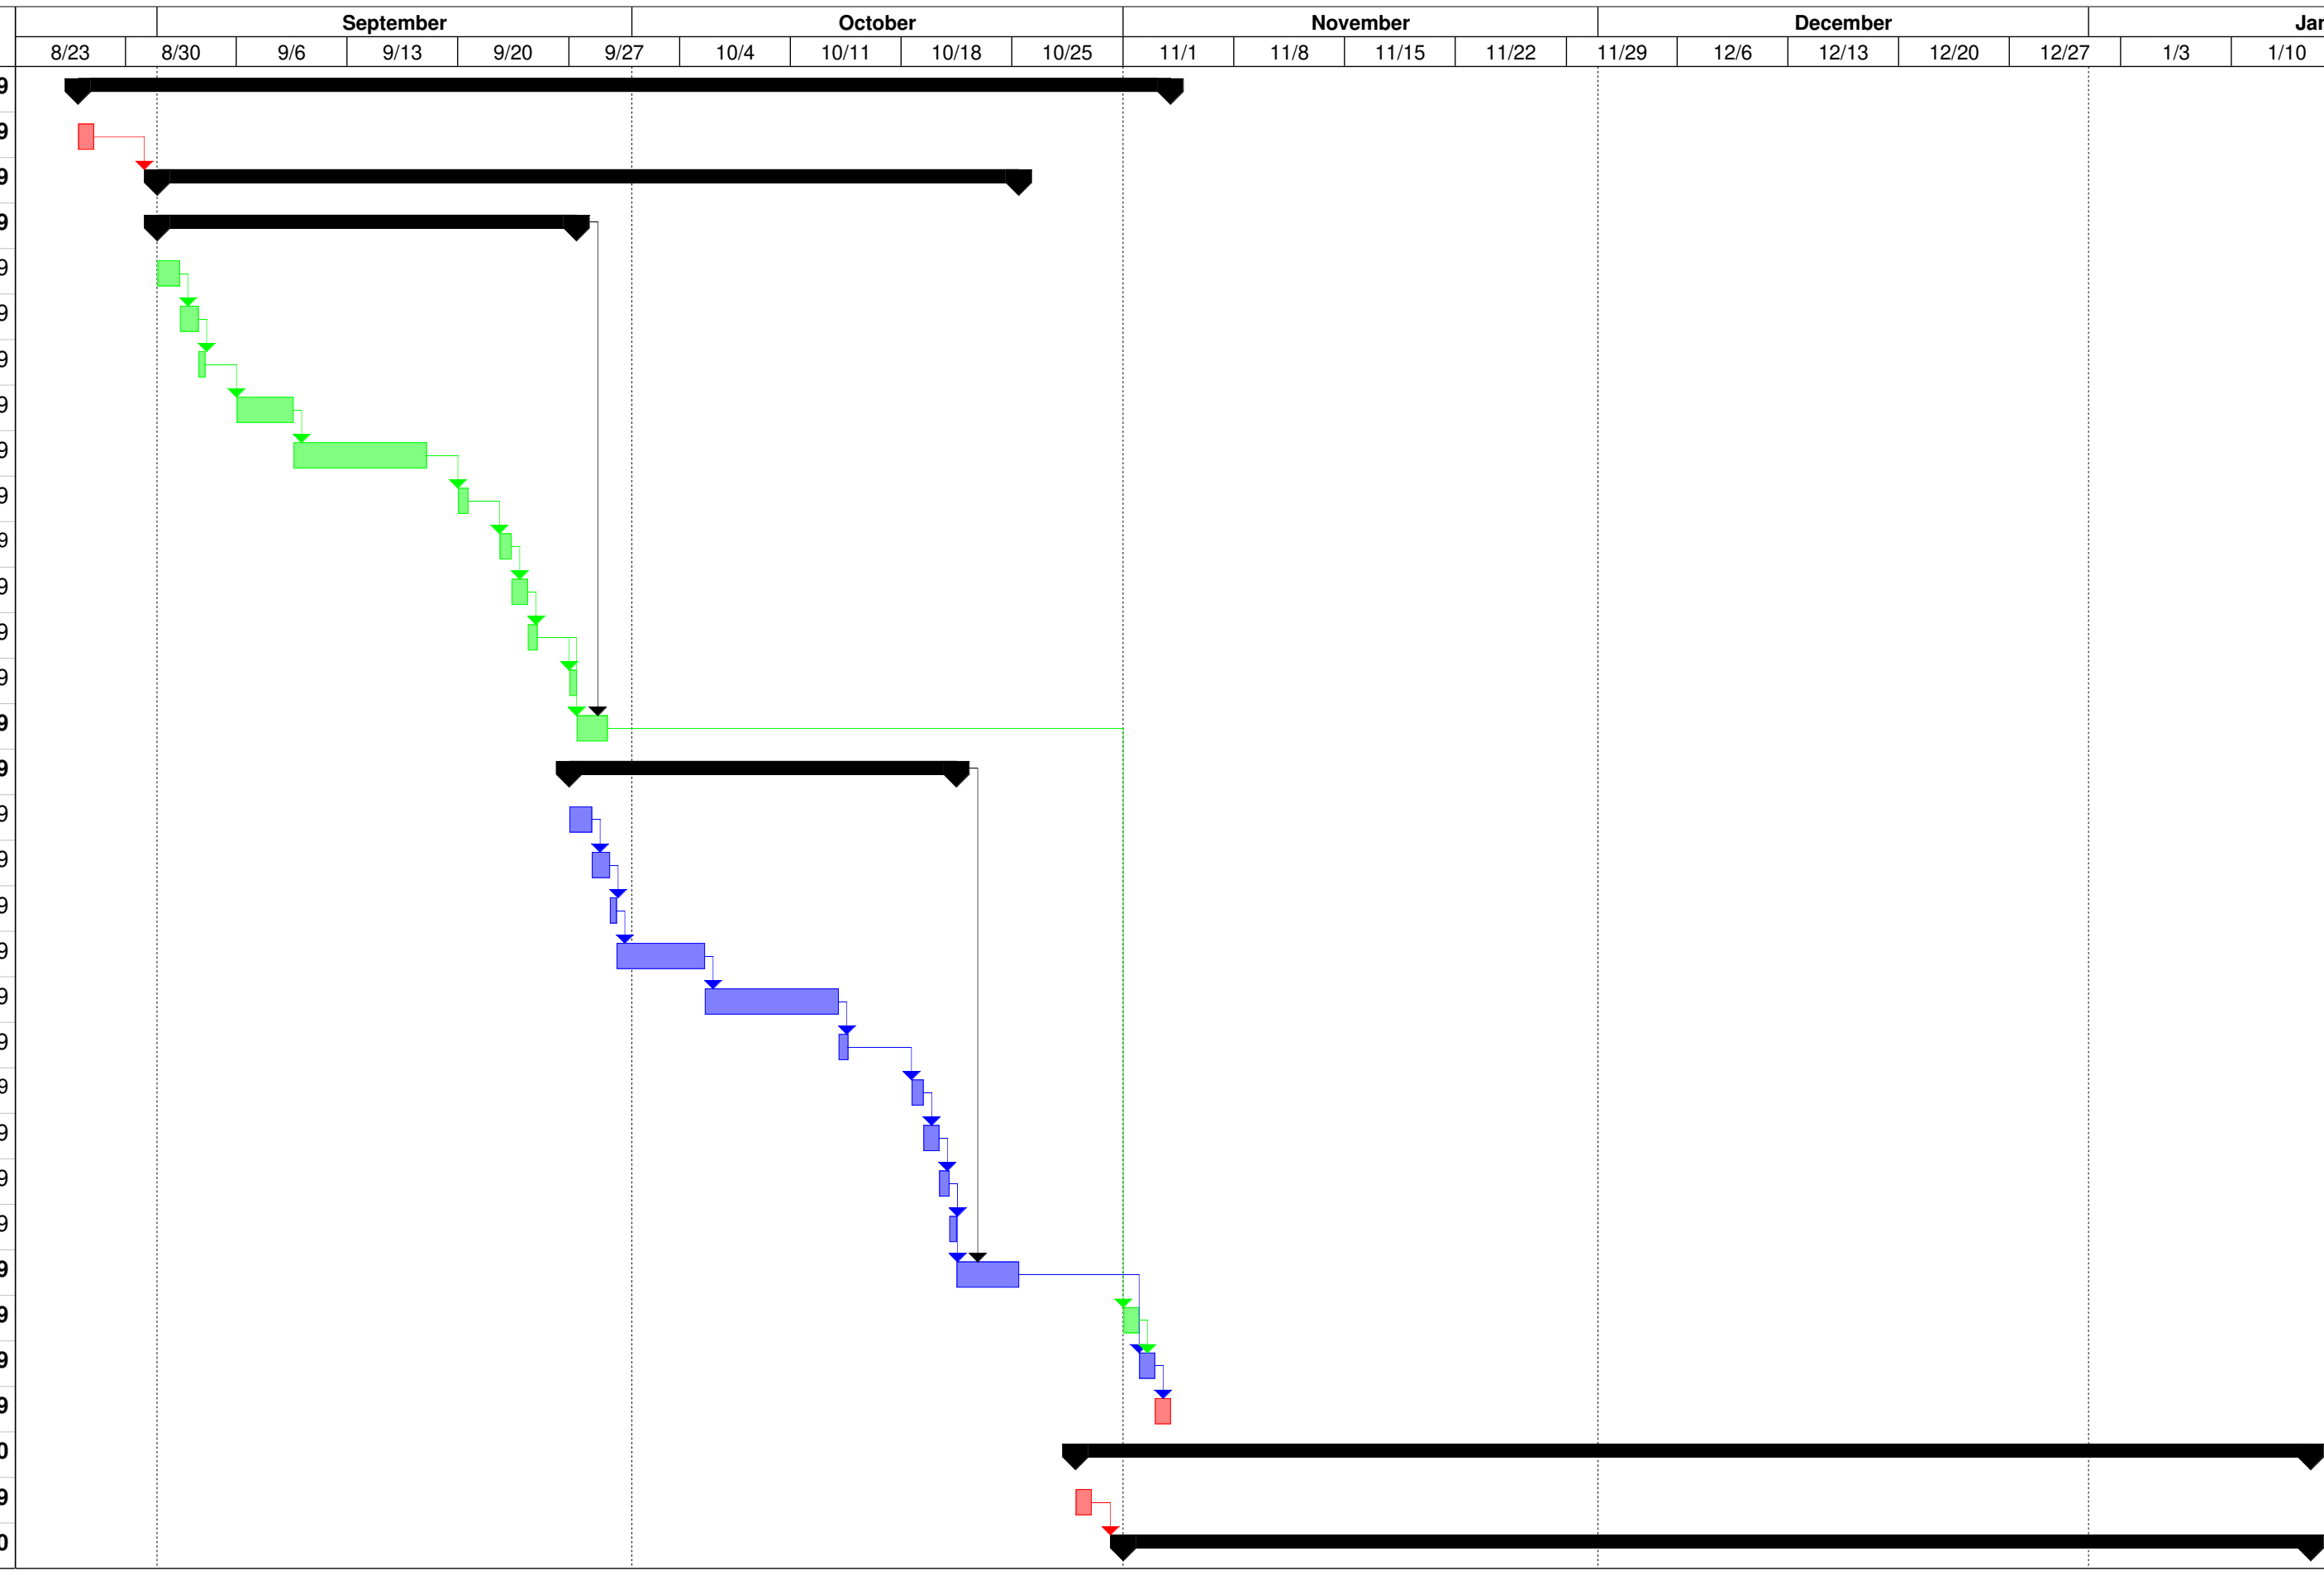

Project:
Date: Thu 11/5/98

Task | Progress | Milestone | Summary | Rolled Up Task | Rolled Up Milestone | Rolled Up Progress
